


## Verslag VTC 14 juni 2013

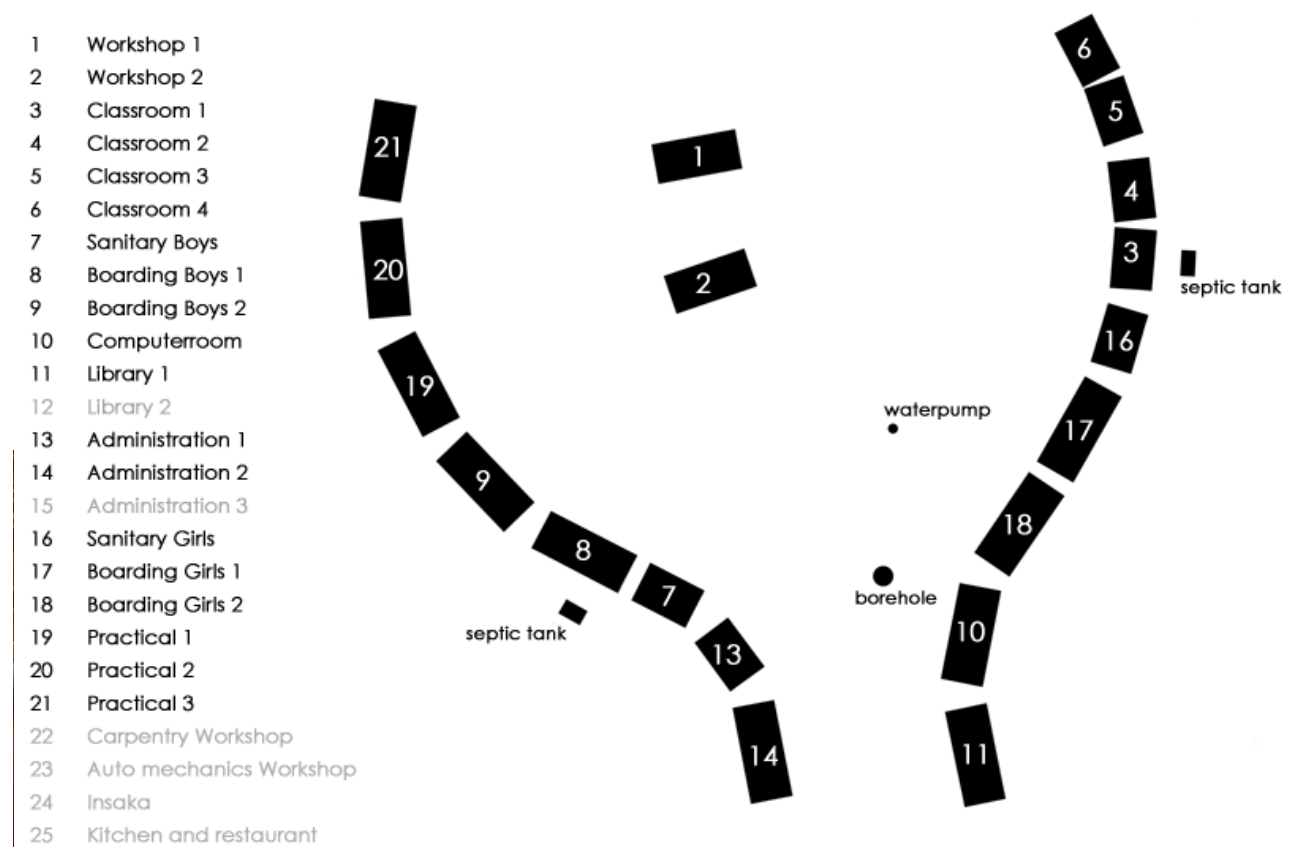

Beste GKMT,

Onderstaand het verslag van de afgelopen maand.

**Classroom 1.** Op schilderwerk en elektra na helemaal af en doet dienst als demogebouw voor bezoekers. Er is binnenin rondom een kabelgoot gemaakt waardoor inbouw wandcontactdozen en bedrading eenvoudig en op flexibele wijze kunnen worden aangebracht (zie foto's onder). Alle kozijnen aan de buitenkant afgewerkt met stootplinten en dorpels. Bepleistering binnen en buiten gerepareerd. Deuren voorzien van sloten.



**Sanitary boys.** Alle binnenwanden gepleisterd, klaar voor betegeling, aanvoer waterleidingen voor douches, wasbakken en stortbakken geïnstalleerd. Alle kozijnen aan de buitenkant afgewerkt met stootplinten en dorpels. Buitendeuren zijn af, maar moeten nog afgehangen worden. We hebben een demodeur voor de douches en toiletten af. (zie foto onder)



**Boarding boys 1.** Binnenwanden opgemetseld en randbalken gestort. Alle kozijnen aan de buitenkant afgewerkt met stootplinten en dorpels (zie foto boven). Buitendeuren zijn af, maar moeten nog afgehangen worden.

**Boarding boys 2.** Vloer gestort met voldoende wapening en scherp zand, waardoor poeren voor de binnenwanden niet meer nodig zullen zijn. *Upperstructure* gemetseld (zie foto onder).

**Computerroom.** *Covering* gevels is klaar (zie foto onder).



**Library 1.** Gordingen, tengels en veranda overstek gemonteerd. Klaar voor de dakdekkers. De verwachting is dat vanaf volgende week de dakdekkers terug zullen komen. Paul is *fulltime* gras aan het inkopen en zodra er genoeg is zullen de dakdekkers komen om *administration 2* af te maken en vervolgens *administration 1*, *boarding girls* en *library 1* te dekken.

**Sanitary girls.** Dakspanten gemaakt en gemonteerd.



**Veranda.** Fundering gestort en opgemetseld met betonblokken. Om de twee gebouwen komt een looppad dat de veranda's verbind en we hebben besloten om het uit te voeren met taluds in plaats van traptreden vanwege rolstoelen (eis van de planningscommissie). De veranda wordt per gebouw gedilateerd (zie foto onder).





**Generator.** De generator is weer klaar. Kosten zo'n 100 euro. Moet vanaf nu op regelmatige tijden worden onderhouden.


**Kadaster.** Het *siteplan* ontvangen van de planningscommissie. Volgens deze tekening is een strook grond van 50 meter breed aan de rechter kant (waarover een maand geleden nog tevergeefs onderhandelingen hebben plaats gevonden) reeds in bezit van het GCMF. De documenten heb ik echter niet, dus bevestigen is moeilijk. Ton gaat Tijs vragen naar aankoopdatum en het betaalde bedrag. Een en ander kan ik vervolgens laten verifiëren bij de Counsel. Mocht het inderdaad in ons bezit zijn kunnen de onderhandelingen een vervolg krijgen, maar dan slechts omtrent een strook aan de linker zijde (gearceerd). Deze strook is overigens nodig om de workshops op te bouwen dus zou mijns inziens prioriteit mogen krijgen (zie foto's onder)

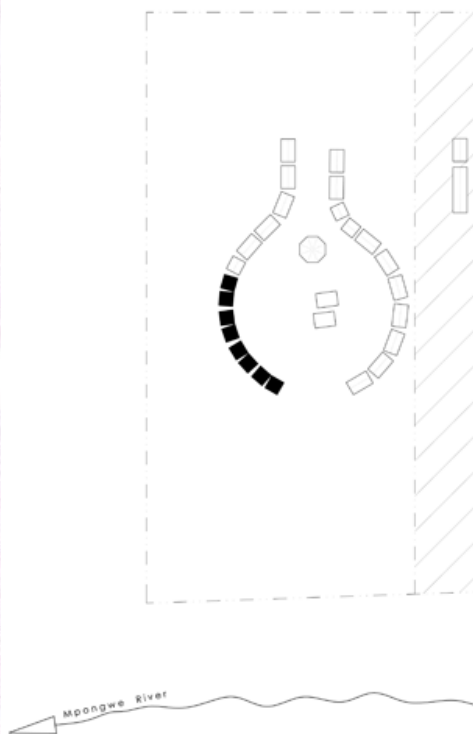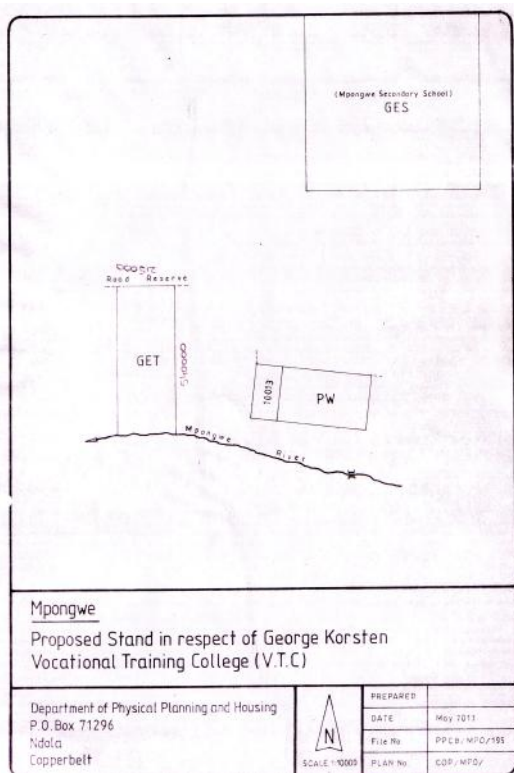

**Overzicht.** Omdat niet iedereen de werktekeningen heeft ontvangen stuur ik jullie een overzicht van hetgeen gepland is en hetgeen reeds gerealiseerd. Ik denk dat dit een goed beeld geeft van waar we staan.


## Uitgetekend

---

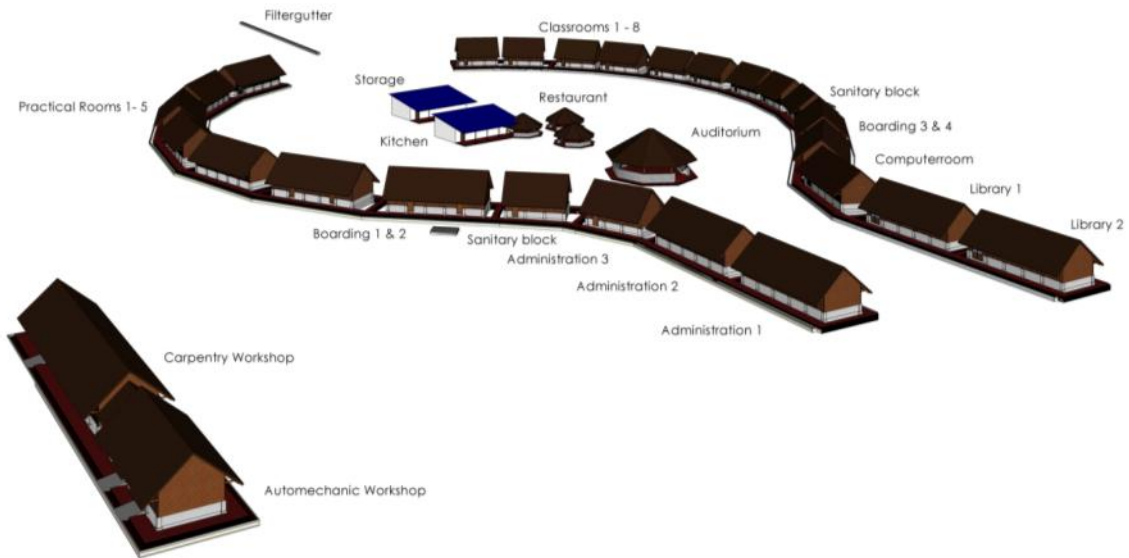

## Gerealiseerd (Juni 2013)

---

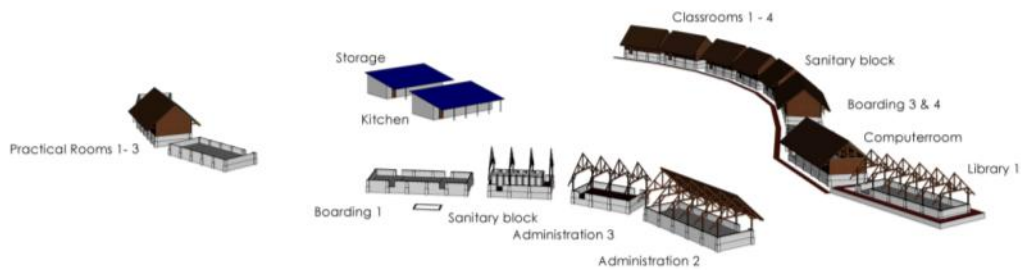

Vriendelijke groeten, Bram
